

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目


水土保持监测季度报告

(2021 年第四季度)

建设单位：南丹县吉朗房地产开发有限责任公司

监测单位：广西南宁师源环保科技有限公司

2022 年 1 月

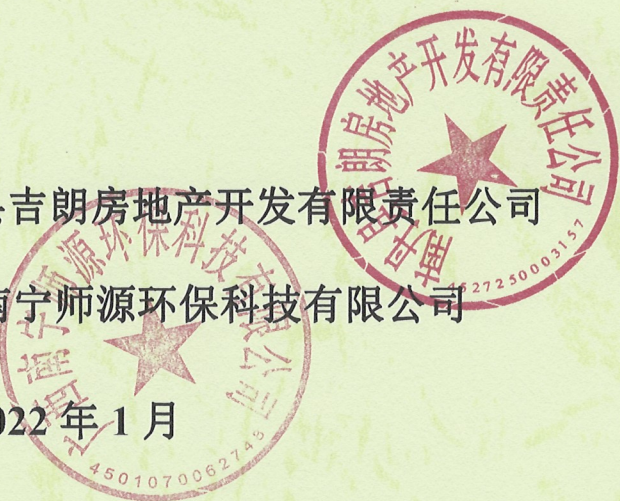

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目

统一社会信用代码
914501030865490874 (1-1)

营业执照
(副本)

扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 广西南宁师源环保科技有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 胡波
经营范围 环境评价, 环保设计及技术咨询, 生态环境规划, 土地规划, 节能评估, 可行性研究报告编制, 水土保持编制, 环保工程竣工验收信息咨询, 社会稳定风险评估, 排污许可信息咨询, 环保工程设计及施工; 销售: 环保产品; 环保技术研究应用及推广。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)

注册资本 壹仟万圆整
成立日期 2014年01月09日
营业期限 2014年01月09日至2024年01月09日
住所 南宁市西乡塘区明秀东路157号虎邱商业综合楼第十层

登记机关 2022 03 24
年 月 日

http://www.gsxt.gov.cn
市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家企业信用信息公示系统网址
国家市场监督管理总局监制

监测单位: 广西南宁师源环保科技有限公司

监测单位地址: 广西南宁西乡塘区明秀东路157号利泰国际大酒店10楼师源环保公司

联系人及电话: 何春霞/15177769437

电子信箱: gxnsyhb@163.com

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目

水土保持监测责任页

广西南宁师源环保科技有限公司

项目负责人：何春霞

批 准	胡波	胡波
审 查	李丽玲	李丽玲
校 核	蒙思慧	蒙思慧
监测人员	何春霞	何春霞
	覃张宁	覃张宁

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目位于河池市南丹县城关镇车马社区，丹城大道西侧，东临丹泉酒业厂区及丹泉广场，中心点坐标东经 107°33'32.30"，北纬 24°59'51.78"，项目区现状有市政道路直达，地块东面紧挨丹城大道，交通十分便利。

项目规划总用地面积约为 15.90hm²，净用地面积为 15.14hm²，建筑占地面积为 3.25hm²，总建筑面积 12.82hm²，地下室总建筑面积 2.73hm²，建筑容积率为 0.64，建筑密度 20.42%，绿地率 30%，机动车停车位 730 个。

工程总投资 65000 万元，土建投资 47900 万元。

本项目于 2019 年 3 月开工，预计于 2022 年 12 月完工，总工期共 46 个月

项目法人为南丹县吉朗房地产开发有限责任公司。

南丹县吉朗房地产开发有限责任公司于 2020 年 9 月获得南丹县发展和改革局颁发的项目备案证明；2020 年 3 月，广西鑫润工程设计有限公司编制完成了《南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目水土保持方案报告书(报批稿)》，2020 年 4 月 29 日，南丹县水利局以(丹水审批〔2020〕7 号)文予以批复。

为了反映该工程水土流失防治责任范围内的水土流失状况及防治现状，掌握水土保持工程实施过程与投入使用初期的水土流失及对周边环境的影响，分析水土保持工程的防治效果，提出如下监测原则：

(1) 全面调查与重点观测相结合

对工程施工区范围进行核实，并对水土流失及其防治状况进行全面调查。在全面调查的基础上，确定水土流失及其防治效果监测的重点区域，并确定相应的观测方法。

（2）定位观测与巡查相结合

根据监测分区和重点，设置一定数量的定位观测点，定期监测土壤侵蚀情况。除采取定位观测外，还不定期进行巡查，对水土流失防治分区、地形地貌、地面组成物质、植被种类、覆盖度等情况通过调查获取。

（4）监测分区与监测内容相结合

监测分区按水土流失防治分区划分确定，根据不同分区水土流失及防治效果特点，确定相应的技术经济可行、操作性较强的监测内容和方法。

为了准确地了解现阶段整个项目区水土流失状况及其周边区域受到的影响和各项水土保持措施的运行情况和完好程度，根据《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB51240-2018）、《水土保持监测技术规程》（SL277-2002）、《南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目水土保持方案报告书》和《南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目水土保持监测实施方案》确定该工程水土保持监测内容如下：

1、防治责任范围核实监测

建设项目的防治责任范围包括项目建设区和直接影响区。项目建设区分为永久占地和临时占地，占地面积及直接影响区面积随着工程进展有一定的变化，防治责任范围监测主要对工程永久和临时征地范围的调查核实，确定监测时段内的水土流失防治责任范围面积。

2、扰动、损坏地表和植被面积的监测

工程建设中扰动、损坏地表和植被面积的过程也是一个动态过程，是随着工程的进展逐步进行的，对该项内容的监测就是为了掌握水土流失面积变化的动态过程。本项内容包括两个方面：

（1）扰动、损坏地表植被的面积及过程；

（2）项目区挖方、填方数量，堆放、运移情况以及回填、余方处置、

临时堆土体积、形态变化情况。

3、弃土弃渣监测

监测施工过程中弃土弃渣数量、堆放位置、是否位于指定地点以及采取的防治水土流失措施。

4、土壤流失量监测

土壤流失量监测包括地表扰动类型监测和不同扰动类型侵蚀强度监测。通过扰动面积和侵蚀强度确定不同阶段土壤流失量。地表扰动类型监测包括扰动类型判别与面积监测。不同扰动类型其侵蚀强度不同，在监测过程中，调查扰动的实际情况并进行适当的归类，在此基础上进行面积监测然后根据侵蚀强度计算土壤侵蚀量。

5、水土流失防治措施及防治效果监测

水土流失防治措施及防治效果监测包括水土保持工程措施和植物措施的监测。工程措施（包括临时防护措施）主要监测实施数量、完好程度、运行情况、措施的拦渣保土效果。林草措施主要监测不同阶段林草种植面积、成活率、生长情况及覆盖率等。

6、水土流失危害监测

根据项目区地形条件和周围环境，通过调查分析，确定水土流失去向，监测项目区内水土流失对周边地区生态环境的影响。我公司在承担这项监测任务后，组织技术骨干编制该项目的水土保持监测实施方案，制定了监测技术细则。我公司于 2022 年 1 月对项目进行了全面回顾性调查监测，通过分析后，确定在整个项目区布设 3 个监测点。

本项目水土保持监测采取地面监测、调查监测和巡查监测相结合的监测方法。地面监测利用 GPS 进行定位，选取有代表性的典型断面布设监测点，采取简易水土流失量测场和侵蚀量测法测定土壤的流失量；同

时，结合布设的地面监测点选取植物调查样方，监测植物措施的成活率、保存率和林草覆盖度等林草恢复情况。用调查和巡查方法是在各防治责任区的不同施工阶段，进行全面调查和巡查，监测工程施工对土地的扰动情况、弃土弃渣的处理情况、水土保持工程实施情况、水土保持工程的稳定完好情况等。

根据主体设计资料及现场踏勘，估算项目挖方 37.59 万 m^3 （普通土 37.59 万 m^3 ），填方 29.44 万 m^3 （含表土 1.46 万 m^3 ，普通土 27.98 万 m^3 ），弃方全部运往南丹县娄双砖厂用于制砖，借方 1.46 万 m^3 ，借方为外购表土。

针对本项目建设特点，项目施工期监测重点主要对主体工程区、施工生产生活区、临时堆土场和连接道路区开展，并进行定期调查，监测项目区扰动地表面积及水土流失防治责任范围面积动态变化，监测项目区内水土保持措施落实情况及防护效果。选取典型区域测定土壤侵蚀强度。对项目区及周边可能发生水土流失危害的部位进行巡查。自然恢复期监测重点为对项目区扰动区域地表恢复情况的调查，以及项目区内水土保持措施落实情况及防治效果以及植被恢复情况实施定时观测。

为了掌握工程建设造成水土流失情况和水土保持防治情况，以便于项目水土保持工作和项目的竣工验收提供科学依据，建设单位于 2022 年 1 月委托广西师源环保科技有限公司（以下简称我公司）对南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目进行水土保持专项监测并签订合同后，2022 年 1 月，我公司组织监测技术人员对工程进行了一次全面调查，收集了有关土建施工和监理等资料，根据项目实地调查结果，项目的水土流失的特点和水土保持措施布局特征及对现有数据的分析统计，同时考虑观测与管理的便利性，在项目区设置了 3 个监测点，分别编码 1#~3#号。

监测点布设完成后，按照正常情况下每月一次和每次大于 50mm 大雨后加测的监测频次对定位观测点进行定期观测，同时，对工程的水土流失防治情况定期进行巡查。具体的监测点位布设与监测内容见表 1。

表 1 水土保持监测布局

序号	监测点	备注
1#	主体工程区	主体工程区均已开挖/填筑完成
2#	边坡区	边坡均已开挖/填筑完成
3#	施工生活生产区	活动板房，占地较小

我公司对项目现状的水土流失情况进行了登记，形成了南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目水土保持监测 2021 年第四季度报告，本季度南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目水土流失情况详见下表。

南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目

水土保持监测季度报告表

监测时段: 2021年10月1日至2021年12月31日

项目名称		南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目		
建设单位		罗康: 19977869998	总监测工程师	
联系人及电话			(签字):	
填表人及电话		何春霞: 15177769437	2022年1月5日	
主体工程 进度	本项目规划总用地面积约为 15.90hm², 净用地面积为 15.14 hm², 建筑占地面积为 3.25hm², 总建筑面积 12.82hm², 地下室总建筑面积 2.73hm², 建筑容积率为 0.64, 建筑密度 20.42%, 绿地率 30%, 机动车停车位 730 个。 本项目于 2019 年 3 月开始建设, 计划于 2022 年 12 月完工, 截止 2021 年第四季度, 主体工程进度已完成约 70%。			
指 标		设计总量	本季度	累计
扰动土地面积 (hm ²)	合 计	15.14	0	15.14
	主体工程建设区	15.14	0	15.14
	施工生产生活区	0.48	0	0.48
	边坡区	0.39	0	0.39
取土(石、料)场数量(个)		0	0	0
弃土(石、渣)场数量(个)		0	0	0
取土(石、料) 情况(万 m ³)	合 计	0	0	0
	其他取土	0	0	0
弃土(石、渣) 情况(万 m ³)	合 计	0	0	0
	其他弃土	0	0	0
	渣土防护率(%)	94	94	94
指 标		设计总量	本季度	累计
水土保持 措施	绿化覆土(m ³)	14564	1000	1000
	雨水工程(m)	1543	300	300
	截排水沟(m)	812	300	300
	浆砌石方格骨架(m ²)	846	0	0

程 进 度		场地整治（hm ² ）	0.48	0	0
		沉沙池（座）	2	0	0
	植物 措施	绿化工程（m ² ）	47700	4000	4000
		草皮护坡（m ² ）	846	0	0
	临时 措施	临时排水沟（m）	1618	300	500
		沉沙池（座）	4	1	2
		临时覆盖（m ² ）	7000	1500	2500
水土流 失影响 因子	降雨量（mm）		10月233.5mm，11月202.7mm，12月58.4mm		
	最大24小时降雨（mm）		10月47.6mm，11月53.5mm，12月33.9mm		
	平均风速（m/s）		10月1.71m/s，11月1.33m/s，12月1.46m/s		
	最大风速（m/s）		10月5m/s，11月7m/s，12月4m/s		
指 标			本季度		累计
水土流失量（t）			145		1689
水土流失灾害事件		无			
存 在 问 题 及 建 议	存在问题： 1、项目施工生产生活区没有实施排水设施，导致场地内积水无法顺畅排出。 2、部分边坡区边坡已形成，没有采取临时拦挡措施。 3、边坡区临时排水沟有轻微淤积。 建议： 1、建议对在施工生产生活区周边开挖临时排水沟及沉沙池。 2、建议对边坡区内已成型裸露边坡补充临时覆盖并及时完成后续防护措施。 3、建议对边坡区临时排水沟及时清淤。				

生产建设项目水土保持监测三色评价指标及赋分表

项目名称		南丹县丹泉小镇丹泉文化旅游创业园项目		
监测时段和防治责任范围		2021 年第四季度, 15.14 公顷		
三色评价结论 (勾选)		绿色 ☐ 黄色 ☒ 红色 ☐		
评价指标		分值	得分	赋分说明
扰动 土地 情况	扰动范围 控制	15	15	按赋分方法, 擅自扩大施工扰动面积达到 1000 平方米, 存在 1 处扣 1 分, 超过 1000 平方米的按照其倍数扣分(不足 1000 平方米的部分不扣分), 扣完为止。 本项目各工程分区均按照设计红线范围进行施工, 因此得分为 15 分。
	表土剥离 保护	5	5	按赋分方法, 表土剥离保护措施未实施面积达到 1000 平方米, 存在 1 处扣 1 分, 超过 1000 平方米的按照其倍数扣分(不足 1000 平方米的部分不扣分), 扣完为止。 本项目无可剥离的表土, 经统计得分为 5 分。
	弃土(石、 渣)堆放	15	15	按赋分方法, 在水土保持方案确定的专门存放地外新设弃渣场且未按规定履行手续的, 存在 1 处 3 级以上弃渣场的扣 5 分, 存在 1 处 3 级以下弃渣场的扣 3 分; 乱堆乱弃或者顺坡溜渣, 存在 1 处扣 1 分。扣完为止。 本项目目前不设弃土场, 土石方全部用于回填, 与方案批复的一致, 故得分为 15 分。
水土流失状况		15	14	按赋分方法, 根据土壤流失总量扣分, 每 100 立方米扣 1 分, 不足 100 立方米的部分不扣分。扣完为止。 本季度土壤流失总量为 145t, 按 1.35t/m ³ 换算为 195.75m ³ , 每 100m ³ 扣 1 分, 小于 100m ³ 不扣分, 按赋分方法, 得分 14 分。
水土 流失 防治 成效	工程措施	20	12	按赋分方法, 水土保持工程措施(拦挡、截排水、工程护坡、土地整治等)落实不及时、不到位, 存在 1 处扣 1 分; 其中弃渣场“未拦先弃”的, 存在 1 处 3 级以上弃渣场的扣 3 分, 存在 1 处 3 级以下弃渣场的扣 2 分。扣完为止。 本项目不涉及弃渣场设置, 各项工程措施正在有序进行, 经统计计算, 得分为 12 分。
水土 流失	植物措施	15	4	按赋分方法, 植物措施未落实或者已落实的成活率、覆盖率不达标面积达到 1000 平方米, 存在 1 处扣 1 分, 超过 1000 平方米的按照其倍

防治成效				数扣分（不足 1000 平方米的部分不扣分）。扣完为止。 本项目植物措施正在实施，经统计得分为 4 分。
	临时措施	10	4	水土保持临时防护措施（拦挡、排水、苫盖、植草、限定扰动范围等）落实不及时、不到位，存在 1 处扣 1 分。扣完为止。 本项目各工程区在可进行临时拦挡、排水和苫盖等措施的大部分区域未设置临时防护措施，部分区域由于正在施工临时措施需完善加强。经统计得分为 4 分。
水土流失危害		5	5	按赋分方法，一般危害扣 5 分；严重危害总得分为 0。 本季度无水土流失危害，得分 5 分。
合计		100	74	得分 80 分及以上的为“绿色”，60 分及以上不足 80 分的为“黄”色，不足 60 分的为“红”色。

备注：1.监测季报三色评价得分为各项评价指标得分之和，满分为 100 分。

2.发生严重水土流失危害事件，或者拒不落实水行政主管部门限期整改要求的生产建设项目，实行“一票否决”，三色评价结论为红色，总得分为 0。

3.上述扣分规则适用超过 100 公顷的生产建设项目；不超过 100 公顷的生产建设项目，各项评价指标（除“水土流失危害”）按上述扣分规则的两倍扣分。



主体工程区施工现状（一）



主体工程区施工现状（二）



主体工程区施工现状（三）



主体工程区施工现状（四）



主体工程区施工现状（五）



主体工程区施工现状（六）



边坡区施工现状（一）



边坡区施工现状（二）

图 1 项目施工现状
